

Информация о комплексном благоустройстве дворовых территорий в Истринском муниципальном районе

Администрация Истринского муниципального района сообщает, что в районе активно ведутся работы по комплексному благоустройству.

•Так, в городском поселении Истра по всем 11 дворовым территориям (10% от общего числа дворов поселения) проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик - ООО «Вектор». В настоящий момент на 4 дворовых территориях (ул. 9 Гв. Дивизии, д.51, ул. Советская д.36,36а, ул. Кооперативная д.8, ул. Босова, д. 12) начаты работы.



Работы проводятся за счет субсидий из ГУДХ (2 244 500руб) и собственных средств поселения (4 610 007,81 руб.)

Также в г.п. Истра уже укомплектованы 2 детские игровые площадки (вне плана по комплексному благоустройству): в военном городке Истра-1, на ул. Кирова, д.8.



По адресу: пл. Революции, д.9 ведутся работы по установке ДИП за счет средств инвестора.



- В городском поселении Дедовск начаты подготовительные работы по комплексному благоустройству, а именно:

1. г. Дедовск, ул. Ногина д.1 – ведутся подготовительные работы по ремонту асфальтового покрытия придомовой территории, аукцион по устройству детской игровой площадки состоялся 06.07.15., в настоящее время заключен муниципальный контракт.


2. г. Дедовск, ул. Жукова, д. 2 ведутся подготовительные работы по устройству автопарковки со стороны проезжей части



3. г. Дедовск, ул. Центральная площадь д.1 – завершены ремонтные работы асфальтового покрытия



4. г. Дедовск, ул. Гагарина, д.17, Ударная д.2 - ведутся ремонтные работы асфальтового покрытия, аукцион по устройству детской игровой площадки состоится 03.08.2015г.

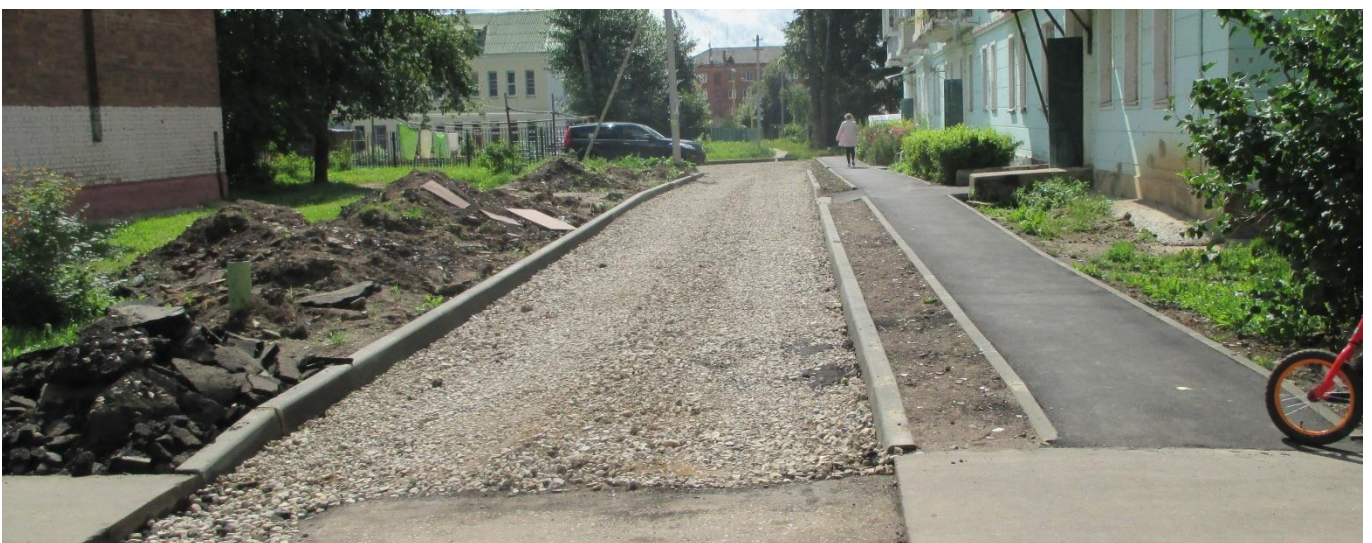

5. г. Дедовск, ул. Победы д.1 - ведутся подготовительные работы по расширению парковки



б. г. Дедовск, ул. Победы д.1 к.1 ведутся подготовительные работы по расширению парковки



- В городском поселении Снегири аукцион по благоустройству дворовых территории прошёл 16 мая 2015 года. На данный момент ведутся работы по ремонту всех придомовых территорий (Ленина 22, 24, 24а, 24б, Мира 14, 14а, Мира 14б, 14в):

1. Произведено асфальтирование дворовой территории по ул. Ленина д.д. 22, 24, 24а 24б с установкой бордюрного камня. Площадь асфальтирования 1870 м², общая сумма работ 3 090 774,37 руб.: в том числе субсидии области 715 674,37 руб., муниципальные средства администрации Снегири 2 375 674,37 руб., что составляет 76,8 % от суммы работ.

2. Произведено асфальтирование дворовой территории по ул. Мира 14 - 14а, с установкой бордюрного камня. Площадь асфальтирования 1120 м², общая сумма работ 1 961 928,69 руб.: в том числе субсидии области 132 000 руб., муниципальные средства администрации Снегири 1 829 928,69 руб., что составляет 93,3 % от суммы работ.

3. Произведено асфальтирование дворовых территорий по ул. Мира 14б - 14в с установкой бордюрного камня площадь асфальтирования 910 м², общая сумма работ 1 615 977,23 руб.: в том числе субсидии области 399 100 руб., муниципальные средства администрации Снегири 1 216 877,23 руб., что составляет 75,3 % от суммы работ.



На детской игровой площадке по ул. Московская, 29/2 установлено ограждение (забор) и произведена отсыпка песком,

Также по благоустройству проводится окос травы во дворе и на детской площадке.

• В сельском поселении Бужаревское к комплексному благоустройству запланирован двор по адресу: д. Бужарово, д 18,20

На сегодняшний день:

1) покрашены бордюры и лавочки

2) устроены клумбы

3) проходит конкурс на установку детской игровой площадки





- В сельском поселении Букаревское проведены следующие работы:

1) п. Глебовский, микрорайон, д.1-5 произведен окос травы, отремонтированы малые архитектурные формы на детской площадке. Установлены две опоры со светильниками. Использованы средства местного бюджета в размере 77520 рублей. Планируется установка информационного стенда.

2) п. Глебовский, микрорайон, д.11-15 произведен окос травы, отремонтированы малые архитектурные формы на детской площадке. Использованы средства местного бюджета в размере 8335 рублей

3) п. Глебовский, микрорайон, д.95 произведен окос травы, отремонтированы малые архитектурные формы на детской площадке. Использованы средства местного бюджета в размере 12820 рублей

- С.п. Ермолинское. в п. Агрогородок, дома 1-5:

- специализированной организацией подготовлена схема расположения игровых элементов детской площадки с учетом расположения зеленых насаждений;
- подготовлена смета на приобретение и установку игрового оборудования, направлена в Администрацию Истринского муниципального района на проверку.

После проверки планируется проведение конкурсной процедуры. Сроки завершения комплексного благоустройства – не позднее 01.10.2015г.

Также за счет местного бюджета планируется установить детские игровые площадки по адресу: п. Агрогородок между домами №17-19 и около дома №26.

- В сельском поселении Ивановское дворовая территория, запланированная к комплексному благоустройству в 2015г. - пос.ст.Манихино, ул.Военно-морская,д.1,3. По ней:

- подготовлена аукционная документация на благоустройство придомовой территории.

- аукционная документация по установке ДИП находится в администрации Истринского муниципального района для размещения.

Определена начальная (максимальная) цена контракта - 781 914 рублей (семьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот четырнадцать рублей 00 копеек)

Также администрация с.п. Ивановское вышла на аукцион по следующей позиции: Текущий ремонт асфальтового покрытия площадью 7200м² п.ст.Манихино, ул.Военно-морская. Начальная (максимальная) цена контракта 5 943 749 рублей 00 копеек (пять миллионов девятьсот сорок три тысячи семьсот сорок девять рублей 00 копеек).

- В с.п. Костровское запланировано благоустройство дворовой территории по адресу д.Кострово, ул.Центральная, д.28 (замена ламп уличного освещения 2 штуки на энергосберегающие и установка детской площадки) на сентябрь-октябрь 2015 года по мере поступления средств в местный бюджет.

Также будут установлены 2 детские игровые площадки по адресам: д. Кострово, ул. Центральная, д.28, ул. Сиреневая, д.73 (срок: август-сентябрь 2015г.) и ограждено футбольное поле (срок: август-сентябрь 2015г.)

- В сельском поселении Лучинское конкурс по комплексному благоустройству дворовых территорий «Оказание услуг в области комплексного благоустройства земельных участков и ландшафтной архитектуры на территории сельского поселения Лучинское» находится на стадии согласования заключения контракта с единым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в администрации Истринского муниципального района по следующим видам работ:

- п. Первомайский, 10,14,16 –устройство площадки для отдыха, а так же по обустройству стоянки для автомобилей в п. Котово д.4,5 и 6,7

Конкурс будет проведен 30.07.2015г.

- с.п. Новопетровское. 26.06.2015 г. - планируемый срок размещения извещения об осуществлении закупки на поставку ограждения для детских площадок во дворах:

1) с. Новопетровское, ул. Северная 13,14,15,16,17
ограждение детской площадки

2) д. Пречистое 1,2,11,27,46. 26.06.2015 г.

- ограждение детской площадки

- установка игровых форм (карусель), закупка игровых форм назначена на 07.08.2015 г.

Проведение аукциона на поставку ограждения для детских площадок назначено на 24.07.2015 г.

- В сельском поселении Обушковское:

1) Проведено частичное благоустройство дворовой территории ул. Майская д.1,2,4,18. А именно произведены планировочные работы и высажены деревья и кустарники.



Проведены два аукциона и заключены муниципальные контракты на 2799 т.р и 2800 т.р. по благоустройству дворовых территорий. Согласно контракту планируется устройство тротуаров из брусчатки, бордюрного камня, экранного ограждения с элементами декора. Работы планируется завершить к 01.09.2015г.

- Сельское поселение Онуфриевское. Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: с. Онуфриево, ул. Центральная, д.19,20 продолжается. Проведены работы по ограждению детской площадки. Закончилась конкурсная процедура по ремонту асфальто-бетонного покрытия внутриквартальных дорог, муниципальный контракт подписан, работы начнутся 27.07.2015г.

- Сельское поселение Павло-Слободское. На данный момент благоустройство трех дворов находится на стадии подготовки необходимой документации для проведения работ.

- Администрацией с.п. Ядроминское разрабатывается схема планировочной организации земельного участка населенного пункта п. Курсаково, которая включает в себя работы по благоустройству территории, определению границ дворовых территорий и т.д. Работы по разработке схемы и уточнения необходимых мероприятий будет завершены до августа 2015г.
